



Ejecución presupuestaria del MAPMM. (Marzo 2023)

Incluye desglose por municipios




GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

MAP
MAR MENOR

MARCO de ACTUACIONES
PRIORITARIAS para
RECUPERAR el MAR MENOR




Avance ejecución presupuesto MAPMM

Fecha de actualización de datos: marzo de 2023

LÍNEAS MAPMM	I. INICIADO		II. COMPROMETIDO/ CONTRATADO		III. EJECUTADO*		MAPMM
	Mill. €	%	Mill. €	%	Mill. €	%	Mill. €
1. Ordenación y vigilancia del dominio público hidráulico	13,100	50,35%	13,090	50,31%	8,116	31,19%	26,020
2. Restauración y mejora ambiental en el ámbito de la cuenca del Mar Menor. Soluciones basadas en la naturaleza	209,861	92,08%	33,509	14,70%	5,818	2,55%	227,900
3. Protección de la ribera del Mar Menor y la ribera mediterránea	6,590	23,79%	1,621	5,85%	1,601	5,78%	27,700
4. Gestión de riesgos de inundaciones y actuaciones de reducción de la carga contaminante	124,887	68,62%	27,650	15,19%	26,853	14,75%	182,000
5. Conservación de la biodiversidad	15,280	311,84%	15,280	311,84%	0,400	8,16%	4,900
6. Apoyo a la transición de sectores productivos	11,213	-	11,213	-	6,722	-	-
7. Reformas normativas	-	-	-	-	-	-	-
8. Mejora del conocimiento y seguimiento	4,508	28,90%	4,508	28,90%	0,800	5,13%	15,600
9. Planificación y Visión a medio-largo plazo	0,180	89,96%	0,180	89,96%	0,106	53,04%	0,200
10. Información pública y participación social	0,726	726,42%	0,726	726,42%	0,281	280,69%	0,100
TOTAL	386,345	79,75%	107,778	22,25%	50,697	10,47%	484,420

* Ejecutado: Certificado/pagado

Evolución en la ejecución del Presupuesto del MAPMM

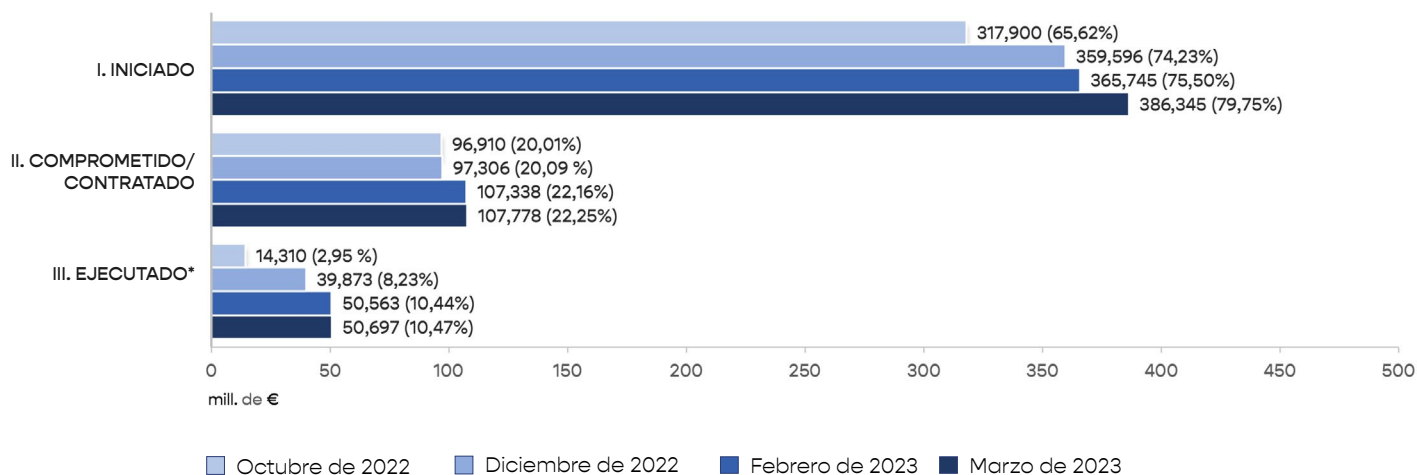

Actuaciones territorializables y no territorializables

	I. INICIADO	II. COMPROMETIDO/ CONTRATADO	III. CERTIFICADO/ PAGADO	TOTAL MAPMM		
	Mill €	Mill €	Mill €	Mill €		
Actuaciones territorializables						
TM Cartagena	135,045	15,838	10,493	484,42		
TM Fuente Álamo	2,048	2,048	1,646			
TM La Unión	49,260	3,000	1,150			
TM Los Alcázares	46,443	10,862	10,595			
TM Murcia	14,442	2,362	1,840			
TM San Pedro del Pinatar	13,611	4,192	4,150			
TM San Javier	22,719	8,160	8,036			
TM Torre Pacheco	40,968	5,366	2,404			
Actuaciones territorializables¹ (Total)	324,535	66,99%	51,828	10,70%	40,315	8,32%
Actuaciones no territorializables	61,810	12,76%	55,950	11,55%	10,382	2,14%
TOTAL	386,345	79,75%	107,778	22,25%	50,697	10,47%

¹ En los municipios del MAPMM; %= sobre el presupuesto total del MAPMM de 484,42 Mill €.

Principales líneas de inversión territorializables

LÍNEAS MAPMM	PRESUPUESTO ACTUACIONES TERRITORIALIZABLES (Mill €)									
	Cartagena	Fuente Álamo	La Unión	Los Alcázares	Murcia	San Pedro del Pinatar	San Javier	Torre Pacheco	TOTAL	
2. Restauración y mejora ambiental en el ámbito de la cuenca del Mar Menor. Soluciones basadas en la naturaleza	124,814	0,548	46,260	2,790	0,548	3,000	8,230	0,175	186,364	I. Iniciado
	8,917	0,548	-	-	0,548	-	-	-	10,012	II. Comprometido/ Contratado
	5,003	0,146	-	-	0,146	-	-	-	5,296	III. Ejecutado
3. Protección de la ribera del Mar Menor y la ribera mediterránea	4,354	-	-	-	-	1,169	0,859	-	6,382	I. Iniciado
	1,114	-	-	-	-	-	0,299	-	1,413	II. Comprometido/ Contratado
	1,114	-	-	-	-	-	0,279	-	1,393	III. Ejecutado
4. Gestión de riesgos de inundaciones y actuaciones de reducción de la carga contaminante	4,077	1,500	1,000	40,503	13,894	9,442	10,480	38,034	118,930	I. Iniciado
	4,007	1,500	1,000	7,712	1,814	4,192	4,711	2,606	27,543	II. Comprometido/ Contratado
	3,976	1,500	1,000	7,445	1,694	4,150	4,607	2,404	26,777	III. Ejecutado

Los Alcázares (1/2)

Fecha de actualización de datos: marzo de 2023

LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS	I. INICIADO		II. COMPROMETIDO/ CONTRATADO		III. EJECUTADO		MAPMM
	Mill. €	%	Mill. €	%	Mill. €	%	
2.- Restauración y mejora ambiental en el ámbito de la cuenca del Mar Menor. Soluciones basadas en la naturaleza	2,790	1,22%	-	-	-	-	227,90
2.1.- Actuaciones de restauración de ecosistemas en franja perimetral del Mar Menor y creación del Cinturón Verde	2,650	5,10%	-	-	-	-	52,00
2.1.3- Filtros verdes	2,650	-	-	-	-	-	
2.1.3.4- EDAR de los Alcázares	2,650	-	-	-	-	-	
2.2.- Renaturalización y mejora ambiental de las Ramblas y creación de corredores verdes que doten de conectividad a toda la red de drenaje, en especial en las ramblas afectadas por la minería	0,140	0,12%	-	-	-	-	115,90
2.2.5- Servicios para la redacción de los anteproyectos de actuaciones de protección de inundaciones en el entorno de Los Alcázares, Torre Pacheco y la desembocadura de la Rambla del Albujión .TT.MM. de Cartagena, Torre Pacheco y Los Alcázares (Murcia) ¹	0,140	-	-	-	-	-	
2.2.5.2- Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Oeste y al Sur del Núcleo Urbano de Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla del Albujión (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares) ²	0,140	-	-	-	-	-	
4. Gestión de riesgos de inundaciones y actuaciones de reducción de la carga contaminante	40,503	22,25%	7,712	4,24%	7,445	4,09%	182,00
4.1.- Actuaciones de gestión de riesgos de inundaciones	30,426	29,60%	2,923	2,84%	2,758	2,68%	102,80
4.1.1- Servicios para la redacción de los anteproyectos de actuaciones de protección de inundaciones en el entorno de Los Alcázares, Torre Pacheco y la desembocadura de la Rambla del Albujión .TT.MM. de Cartagena, Torre Pacheco y Los Alcázares (Murcia) ¹	0,559	-	-	-	-	-	
4.1.1.1- Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Oeste y al Sur del Núcleo Urbano de Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla del Albujión (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares) ²	0,140	-	-	-	-	-	
4.1.1.2- Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS y Corredor Verde para la protección del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Torre Pacheco, San Javier y Los Alcázares. Prov. Murcia) ²	0,105	-	-	-	-	-	
4.1.1.3- Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y nueva entrega a la rambla del Albujión (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena) ²	0,314	-	-	-	-	-	
4.1.2- Obra para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D7 del campo de Cartagena. Repo-ción de servicios de la obra de drenaje transversal bajo la carretera RM F30. T.M Los Alcázares (Murcia)	1,100	-	1,056	-	1,056	-	
4.1.3- Obra para la Canalización de escorrentías a través de la avenida Muñoz Zambudio hasta de desembocadura. T.M. Los Alcázares (Murcia). FASE 1	13,940	-	-	-	-	-	
4.1.4- Obra para la construcción de un Parque fluvial para captación de escorrentías. T.M. Los Alcázares (Murcia). FASE 2	12,960	-	-	-	-	-	
4.1.12- Encargo de Servicios a TRAGSATEC para la redacción de proyectos de defensa contra inundaciones, restauración ambiental y saneamiento	0,567	-	0,567	-	0,402	-	
4.1.14- Ayudas inundación. RD 1158/2020	1,300	-	1,300	-	1,300	-	
4.1.14.4- Ayuntamiento de Los Alcázares	1,300	-	1,300	-	1,300	-	

Detalle de la ejecución presupuestaria por Municipios

Los Alcázares (2/2)

Fecha de actualización de datos: marzo de 2023

LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS	I. INICIADO		II. COMPROMETIDO/ CONTRATADO		III. EJECUTADO		MAPMM
	Mill. €	%	Mill. €	%	Mill. €	%	
4.2.- Renovación de la impulsión de la rambla del Albuji3n	0,747	5,01%	0,747	5,01%	0,727	4,88%	14,90
4.2.1- Obra de Reparaci3n Urgente de la impuls3n de El Albuji3n a El Moj3n ²	0,747	-	0,747	-	0,727	-	
4.3.- Actuaciones complementarias: saneamiento y depuraci3n en la cuenca vertiente al Mar Menor	9,330	14,51%	4,042	6,29%	3,961	6,16%	64,30
4.3.1- Contrato de servicios para la redacci3n de Proyecto Colector Aguas Depuradas de las EDAR de Torre Pacheco y Los Alc3zares hasta la EDAR de San Javier, y otros ²	0,292	-	0,292	-	0,211	-	
4.3.2- Obra del Colector de aguas depuradas de las EDAR de Torre Pacheco y Los Alc3zares hasta la EDAR de San Javier ²	5,288	-	-	-	-	-	
4.3.6- RD 730/2022 Ayudas de car3cter municipal para la implantaci3n de medidas de saneamiento	3,750	-	3,750	-	3,750	-	
4.3.6.2- Ayuntamiento de Los Alc3zares	3,750	-	3,750	-	3,750	-	
6. Apoyo a la transici3n de sectores productivos	3,150	-	3,150	-	3,150	-	
6.3.- Otras ayudas de car3cter transversal	3,150	-	3,150	-	3,150	-	
6.3.6- Planes de sostenibilidad Turística en destino 2022 (*Ayudas estatales no incluidas en los presupuestos del MAPAMM)	3,150	-	3,150	-	3,150	-	
6.3.6.2- Ayuntamiento de Los Alc3zares	3,150	-	3,150	-	3,150	-	
TOTAL	46,443	9,59%	10,862	2,24%	10,595	2,19%	484,42
TOTAL (Solo proyectos o actuaciones que, en su totalidad, se ubican en el TM de Los Alc3zares)	39,417	8,14%	9,823	2,03%	9,658	1,99%	

¹ La redacci3n de estos anteproyectos forma parte de un contrato de servicios que se encuentra en licitaci3n (se ha hecho una distribuci3n proporcional entre ellos, en funci3n de la medida a la que corresponde).

² Actuaci3n ubicada en varios t3rminos municipales, entre ellos Los Alc3zares.

Cartagena (1/3)

Fecha de actualización de datos: marzo de 2023

LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS	I. INICIADO		II. COMPROMETIDO/ CONTRATADO		III. EJECUTADO		MAPMM
	Mill. €	%	Mill. €	%	Mill. €	%	
2.- Restauración y mejora ambiental en el ámbito de la cuenca del Mar Menor. Soluciones basadas en la naturaleza	124,814	54,77%	8,917	3,91%	5,003	2,20%	227,90
2.1.- Actuaciones de restauración de ecosistemas en franja perimetral del Mar Menor y creación del Cinturón Verde	52,300	100,58%	-	-	-	-	52,00
2.1.2- Humedales seminaturales	16,010	-	-	-	-	-	
2.1.2.2- Bocarrambra de Albujon	9,000	-	-	-	-	-	
2.1.2.3- Rambla Miranda	7,010	-	-	-	-	-	
2.1.3- Filtros verdes	14,290	-	-	-	-	-	
2.1.3.1- Albuñón	3,110	-	-	-	-	-	
2.1.3.3- Torre del Negro	11,180	-	-	-	-	-	
2.1.4- Áreas de renaturalización	22,000	-	-	-	-	-	
2.1.4.1- Prioridad 1: frente costero	5,000	-	-	-	-	-	
2.1.4.2- Prioridad 2: zona intermedia	5,500	-	-	-	-	-	
2.1.4.3- Prioridad 3: Ampliación	11,500	-	-	-	-	-	
2.2.- Renaturalización y mejora ambiental de las Ramblas y creación de corredores verdes que doten de conectividad a toda la red de drenaje, en especial en las ramblas afectadas por la minería	26,629	22,98%	8,917	7,69%	5,003	4,32%	115,90
2.2.1- Encargo de obras para la Conservación y mejora ambiental de Ramblas de la cuenca del Mar Menor ²	1,095	-	1,095	-	0,293	-	
2.2.2- Restauración Ramblas Mineras. Fase I	7,740	-	7,740	-	4,700	-	
2.2.2.1- Restauración hidrológico-forestal para la reducción del riesgo de inundación y la mejora ambiental en el dominio público hidráulico de las ramblas de la Sierra Minera de Cartagena (T.M. Cartagena)	7,740	-	7,740	-	4,700	-	
2.2.3- Restauración Ramblas Mineras. Fase II	17,503	-	-	-	-	-	
2.2.3.1- Obra para la Restauración rambla del Beal	3,872	-	-	-	-	-	
2.2.3.2- Obra para la Restauración de las ramblas de la Carrasquilla y Ponce	7,835	-	-	-	-	-	
2.2.3.3- Obra para la Restauración rambla de las Matildes	5,796	-	-	-	-	-	

Detalle de la ejecución presupuestaria por Municipios

Cartagena (2/3)

Fecha de actualización de datos: marzo de 2023

LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS	I. INICIADO		II. COMPROMETIDO/ CONTRATADO		III. EJECUTADO		MAPMM
	Mill. €	%	Mill. €	%	Mill. €	%	
2.2.4- Infraestructura verde y restauración fluvial en la rambla del Albuñón (T.M. de Cartagena), junto al Estrecho de Fuente Álamo	0,082	-	0,082	-	0,010	-	
2.2.5- Servicios para la redacción de los anteproyectos de actuaciones de protección de inundaciones en el entorno de Los Alcázares, Torre Pacheco y la desembocadura de la Rambla del Albuñón .TT.MM. de Cartagena, Torre Pacheco y Los Alcázares (Murcia) ¹	0,210	-	-	-	-	-	
2.2.5.1- Protección Frente a Inundaciones y la Restauración Ambiental de la Rambla del Albuñón TT.MM. Varios (Murcia) ²	0,175	-	-	-	-	-	
2.2.5.2- Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Oeste y al Sur del Núcleo Urbano de Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla del Albuñón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares) ²	0,035	-	-	-	-	-	
2.3.- Actuaciones de restauración de emplazamientos mineros peligrosos abandonados y restauración de zonas afectadas por la minería en la zona de influencia del Mar Menor	45,885	114,71%	-	-	-	-	40,00
2.3.1- Remediación ambiental de residuos mineros y emplazamientos afectados por la minería en los TTMM de Cartagena y La Unión	27,515	-	-	-	-	-	
2.3.1.1 y 2.3.1.10- C1: Núcleo Llano del Beal	4,870	-	-	-	-	-	
2.3.1.5 y 2.3.1.14- C5: Descargador ²	7,550	-	-	-	-	-	
2.3.1.7 y 2.3.1.16- C7: Marqués de Péjar	5,650	-	-	-	-	-	
2.3.1.8- C8: Peña del Águila	9,445	-	-	-	-	-	
2.3.2- Restauración hidrológico-forestal Sierra Minera (TM Cartagena)	18,370	-	-	-	-	-	
3.- Protección de la ribera del Mar Menor y la ribera mediterránea	4,354	15,72%	1,114	4,02%	1,114	4,02%	27,70
3.1.- Protección y recuperación morfológica de la ribera del Mar Menor	4,114	19,31%	1,114	5,23%	1,114	5,23%	21,30
3.1.1- Procedimiento de deslinde para identificar los bienes de DPMT en la playa de Los Nietos (T.M. de Cartagena)	0,018	-	0,018	-	0,018	-	
3.1.2- Procedimiento de deslinde para identificar los bienes de DPMT en El Carmolí (T.M. de Cartagena)	0,027	-	0,027	-	0,027	-	
3.1.4- Adquisición de espacios colindantes con la ribera del mar, necesarios para la protección del DPMT	3,000	-	-	-	-	-	
3.1.6- Acondicionamiento del paseo marítimo Miguel Hernández en Los Urrutias. Fase 1. (T.M. Cartagena)	1,069	-	1,069	-	1,069	-	
3.2.- Protección y recuperación de la ribera mediterránea	0,240	3,75%	-	-	-	-	6,40
3.2.3- Restauración ecológica, eliminación de flora exótica invasora y preservación de sistemas dunares en La Manga del Mar Menor ²	0,240	-	-	-	-	-	

Detalle de la ejecución presupuestaria por Municipios

Cartagena (3/3)

Fecha de actualización de datos: marzo de 2023

LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS	I. INICIADO		II. COMPROMETIDO/ CONTRATADO		III. EJECUTADO		MAPMM
	Mill. €	%	Mill. €	%	Mill. €	%	
4. Gestión de riesgos de inundaciones y actuaciones de reducción de la carga contaminante	4,077	2,24%	4,007	2,20%	3,976	2,18%	182,00
4.1.- Actuaciones de gestión de riesgos de inundaciones	0,577	0,56%	0,507	0,49%	0,476	0,46%	102,80
4.1.1- Servicios para la redacción de los anteproyectos de actuaciones de protección de inundaciones en el entorno de Los Alcázares, Torre Pacheco y la desembocadura de la Rambla del Albuñón .TT.MM. de Cartagena, Torre Pacheco y Los Alcázares (Murcia) ¹	0,070	-	-	-	-	-	
4.1.1.1- Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible SUDS al Oeste y al Sur del Núcleo Urbano de Los Alcázares, Corredores Verdes de Conexión y Nueva Desembocadura de la Rambla del Albuñón (TT.MM. De Cartagena y Los Alcázares) ²	0,035	-	-	-	-	-	
4.1.1.3- Prolongación del Canal D-7 hacia el norte, incremento de su capacidad y nueva entrega a la rambla del Albuñón (TT.MM. de Los Alcázares y Cartagena) ²	0,035	-	-	-	-	-	
4.1.12- Encargo de Servicios a TRAGSATEC para la redacción de proyectos de defensa contra inundaciones, restauración ambiental y saneamiento	0,107	-	0,107	-	0,076	-	
4.1.14- Ayudas inundación. RD 1158/2020	0,400	-	0,400	-	0,400	-	
4.1.14.1- Ayuntamiento de Cartagena	0,400	-	0,400	-	0,400	-	
4.3.- Actuaciones complementarias: saneamiento y depuración en la cuenca vertiente al Mar Menor	3,500	5,44%	3,500	5,44%	3,500	5,44%	64,30
4.3.6- RD 730/2022 Ayudas de carácter municipal para la implantación de medidas de saneamiento	3,500	-	3,500	-	3,500	-	
4.3.6.3- Ayuntamiento de Cartagena	3,500	-	3,500	-	3,500	-	
5. Conservación de la Biodiversidad	0,080	1,63%	0,080	1,63%	0,050	1,02%	4,90
5.1.- Conservación de especies terrestres	0,080	16,00%	0,080	16,00%	0,050	10,00%	0,50
5.1.1- Subvención CARM Jara de Cartagena	0,080	-	0,080	-	0,050	-	
6. Apoyo a la transición de sectores productivos	1,720	-	1,720	-	0,350	-	
6.3.- Otras ayudas de carácter transversal	1,720	-	1,720	-	0,350	-	
6.3.2- Proyecto RESALAR. Regeneración de salinas y arenales en el Mar Menor. Convocatoria grandes proyectos transformadores del área de bioeconomía 2021.	1,720	-	1,720	-	0,350	-	
TOTAL	135,045	27,88%	15,838	3,27%	10,493	2,17%	484,42
TOTAL (Solo proyectos o actuaciones ubicados, en su totalidad, dentro del TM de Cartagena)	125,880	25,99%	14,635	3,02%	10,124	2,09%	

¹ La redacción de estos anteproyectos forma parte de un contrato de servicios que se encuentra en licitación (se ha hecho una distribución proporcional entre ellos, en función de la medida a la que corresponde).

² Actuación ubicada en varios términos municipales, entre ellos Cartagena.

Detalle de la ejecución presupuestaria por Municipios

Fuente Álamo

Fecha de actualización de datos: marzo de 2023

LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS	I. INICIADO		II. COMPROMETIDO/ CONTRATADO		III. EJECUTADO		MAPMM
	Mill. €	%	Mill. €	%	Mill. €	%	
2.- Restauración y mejora ambiental en el ámbito de la cuenca del Mar Menor. Soluciones basadas en la naturaleza	0,548	0,24%	0,548	0,24%	0,146	0,06%	227,90
2.2.- Renaturalización y mejora ambiental de las Ramblas y creación de corredores verdes que doten de conectividad a toda la red de drenaje, en especial en las ramblas afectadas por la minería	0,548	0,47%	0,548	0,47%	0,146	0,13%	115,90
2.2.1- Encargo de obras para la Conservación y mejora ambiental de Ramblas de la cuenca del Mar Menor ¹	0,548	-	0,548	-	0,146	-	
4. Gestión de riesgos de inundaciones y actuaciones de reducción de la carga contaminante	1,500	0,82%	1,500	0,82%	1,500	0,82%	182,00
4.3.- Actuaciones complementarias: saneamiento y depuración en la cuenca vertiente al Mar Menor	1,500	2,33%	1,500	2,33%	1,500	2,33%	64,30
4.3.6- RD 730/2022 Ayudas de carácter municipal para la implantación de medidas de saneamiento	1,500	-	1,500	-	1,500	-	
4.3.6.5- Ayuntamiento de Fuente Álamo	1,500	-	1,500	-	1,500	-	
TOTAL	2,048	0,42%	2,048	0,42%	1,646	0,34%	484,42
TOTAL (Solo proyectos o actuaciones que, en su totalidad, se ubican en el TM de Fuente Álamo)	1,500	0,31%	1,500	0,31%	1,500	0,31%	

¹ Actuación ubicada en varios términos municipales, entre ellos Fuente Álamo.

Detalle de la ejecución presupuestaria por Municipios

Murcia

Fecha de actualización de datos: marzo de 2023

LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS	I. INICIADO		II. COMPROMETIDO/ CONTRATADO		III. EJECUTADO		MAPMM
	Mill. €	%	Mill. €	%	Mill. €	%	
2.- Restauración y mejora ambiental en el ámbito de la cuenca del Mar Menor. Soluciones basadas en la naturaleza	0,548	0,24%	0,548	0,24%	0,146	0,06%	227,90
2.2.- Renaturalización y mejora ambiental de las Ramblas y creación de corredores verdes que doten de conectividad a toda la red de drenaje, en especial en las ramblas afectadas por la minería	0,548	0,47%	0,548	0,47%	0,146	0,13%	115,90
2.2.1- Encargo de obras para la Conservación y mejora ambiental de Ramblas de la cuenca del Mar Menor ¹	0,548	-	0,548	-	0,146	-	
4. Gestión de riesgos de inundaciones y actuaciones de reducción de la carga contaminante	13,894	7,63%	1,814	1,00%	1,694	0,93%	182,00
4.1.- Actuaciones de gestión de riesgos de inundaciones	12,394	12,06%	0,314	0,31%	0,194	0,19%	102,80
4.1.8- Obras del Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier). Provincia de Murcia ¹	12,080	-	-	-	-	-	
4.1.12- Encargo de Servicios a TRAGSATEC para la redacción de proyectos de defensa contra inundaciones, restauración ambiental y saneamiento ¹	0,215	-	0,215	-	0,152	-	
4.1.13- Contrato de Servicios para el proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un sistema de Drenaje Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de Roldán y Bal-cas, TT. MM. de Murcia y Torre Pacheco (Murcia) ¹	0,099	-	0,099	-	0,042	-	
4.3.- Actuaciones complementarias: saneamiento y depuración en la cuenca vertiente al Mar Menor	1,500	2,33%	1,500	2,33%	1,500	2,33%	64,30
4.3.6- RD 730/2022 Ayudas de carácter municipal para la implantación de medidas de saneamiento	1,500	-	1,500	-	1,500	-	
4.3.6.6- Ayuntamiento de Murcia	1,500	-	1,500	-	1,500	-	
TOTAL	14,442	2,98%	2,362	0,49%	1,840	0,38%	484,42
TOTAL (Solo proyectos o actuaciones que, en su totalidad, se ubican en el TM de Murcia)	1,500	0,31%	1,500	0,31%	1,500	0,31%	

¹ Actuación ubicada en varios términos municipales, entre ellos Murcia.



Detalle de la ejecución presupuestaria por Municipios

San Javier (1/2)

Fecha de actualización de datos: marzo de 2023

LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS	I. INICIADO		II. COMPROMETIDO/ CONTRATADO		III. EJECUTADO		MAPMM
	Mill. €	%	Mill. €	%	Mill. €	%	
2.- Restauración y mejora ambiental en el ámbito de la cuenca del Mar Menor. Soluciones basadas en la naturaleza	8,230	3,61%	-	-	-	-	227,90
2.1.- Actuaciones de restauración de ecosistemas en franja perimetral del Mar Menor y creación del Cinturón Verde	8,230	15,83%	-	-	-	-	52,00
2.1.3- Filtros verdes	8,230	-	-	-	-	-	
2.1.3.2- La Calavera	8,230	-	-	-	-	-	
3.- Protección de la ribera del Mar Menor y la ribera mediterránea	0,859	3,10%	0,299	1,08%	0,279	1,01%	27,70
3.1.- Protección y recuperación morfológica de la ribera del Mar Menor	0,159	0,75%	0,159	0,75%	0,159	0,75%	21,30
3.1.7- Conexión de paseo marítimo de Poniente con Puerto deportivo Tomás Maestre, en el Mar Menor (San Javier)	0,159	-	0,159	-	0,159	-	
3.2.- Protección y recuperación de la ribera mediterránea	0,700	10,94%	0,140	2,19%	0,120	1,88%	6,40
3.2.1- Retirada de instalaciones de Puerto Mayor y recuperación ambiental del espacio ocupado por las mismas (T.M. San Javier)	0,140	-	0,140	-	0,120	-	
3.2.3- Restauración ecológica, eliminación de flora exótica invasora y preservación de sistemas dunares en La Manga del Mar Menor ²	0,560	-	-	-	-	-	
4. Gestión de riesgos de inundaciones y actuaciones de reducción de la carga contaminante	10,480	5,76%	4,711	2,59%	4,607	2,53%	182,00
4.1.- Actuaciones de gestión de riesgos de inundaciones	3,940	3,83%	0,815	0,79%	0,752	0,73%	102,80
4.1.1- Servicios para la redacción de los anteproyectos de actuaciones de protección de inundaciones en el entorno de Los Alcázares, Torre Pacheco y la desembocadura de la Rambla del Albuñón .TT.MM. de Cartagena, Torre Pacheco y Los Alcázares (Murcia) ¹	0,105	-	-	-	-	-	
4.1.1.2- Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS y Corredor Verde para la protección del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Torre Pacheco, San Javier y Los Alcázares. Prov. Murcia) ²	0,105	-	-	-	-	-	
4.1.8- Obras del Proyecto de actuaciones de corrección hidrológica y laminación en la rambla de Cobatillas (TT.MM. de Murcia y San Javier). Provincia de Murcia ²	3,020	-	-	-	-	-	
4.1.12- Encargo de Servicios a TRAGSATEC para la redacción de proyectos de defensa contra inundaciones, restauración ambiental y saneamiento	0,215	-	0,215	-	0,152	-	
4.1.14- Ayudas inundación. RD 1158/2020	0,600	-	0,600	-	0,600	-	
4.1.14.3- Ayuntamiento de San Javier	0,600	-	0,600	-	0,600	-	

Detalle de la ejecución presupuestaria por Municipios

San Javier (2/2)

Fecha de actualización de datos: marzo de 2023

LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS	I. INICIADO		II. COMPROMETIDO/ CONTRATADO		III. EJECUTADO		MAPMM
	Mill. €	%	Mill. €	%	Mill. €	%	
4.3.- Actuaciones complementarias: saneamiento y depuración en la cuenca vertiente al Mar Menor	6,540	10,17%	3,896	6,06%	3,855	6,00%	64,30
4.3.1- Contrato de servicios para la redacción de Proyecto Colector Aguas Depuradas de las EDAR de Torre Pacheco y Los Alcázares hasta la EDAR de San Javier, y otros ²	0,146	-	0,146	-	0,105	-	
4.3.2- Obra del Colector de aguas depuradas de las EDAR de Torre Pacheco y Los Alcázares hasta la EDAR de San Javier ²	2,644	-	-	-	-	-	
4.3.6- RD 730/2022 Ayudas de carácter municipal para la implantación de medidas de saneamiento	3,750	-	3,750	-	3,750	-	
4.3.6.1- Ayuntamiento de San Javier	3,750	-	3,750	-	3,750	-	
6. Apoyo a la transición de sectores productivos	3,150	-	3,150	-	3,150	-	
6.3.- Otras ayudas de carácter transversal	3,150	-	3,150	-	3,150	-	
6.3.6- Planes de sostenibilidad Turística en destino 2022 (*Ayudas estatales no incluidas en los presupuestos del MAPAMM)	3,150	-	3,150	-	3,150	-	
6.3.6.1- Ayuntamiento de San Javier	3,150	-	3,150	-	3,150	-	
TOTAL	22,719	4,69%	8,160	1,68%	8,036	1,66%	484,42
TOTAL (Solo proyectos o actuaciones que, en su totalidad, se ubican en el TM de San Javier)	16,244	3,35%	8,014	1,65%	7,931	1,64%	

¹ La redacción de estos anteproyectos forma parte de un contrato de servicios que se encuentra en licitación (se ha hecho una distribución proporcional entre ellos, en función de la medida a la que corresponde).

² Actuación ubicada en varios términos municipales, entre ellos San Javier.

San Pedro del Pinatar

Fecha de actualización de datos: marzo de 2023

LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS	I. INICIADO		II. COMPROMETIDO/ CONTRATADO		III. EJECUTADO		MAPMM
	Mill. €	%	Mill. €	%	Mill. €	%	
2.- Restauración y mejora ambiental en el ámbito de la cuenca del Mar Menor. Soluciones basadas en la naturaleza	3,000	1,32%	-	-	-	-	227,90
2.1.- Actuaciones de restauración de ecosistemas en franja perimetral del Mar Menor y creación del Cinturón Verde	3,000	5,77%	-	-	-	-	52,00
2.1.2- Humedales seminaturales	3,000	-	-	-	-	-	
2.1.2.1- San Pedro del Pinatar	3,000	-	-	-	-	-	
3.- Protección de la ribera del Mar Menor y la ribera mediterránea	1,169	4,22%	-	-	-	-	27,70
3.2.- Protección y recuperación de la ribera mediterránea	1,169	18,27%	-	-	-	-	6,40
3.2.2- Acondicionamiento de las playas de La Llana (T.M. de San Pedro del Pinatar)	1,169	-	-	-	-	-	
4. Gestión de riesgos de inundaciones y actuaciones de reducción de la carga contaminante	9,442	5,19%	4,192	2,30%	4,150	2,28%	182,00
4.1.- Actuaciones de gestión de riesgos de inundaciones	5,557	5,41%	0,307	0,30%	0,276	0,27%	102,80
4.1.10- Obras del Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) en ramblas vertientes a San Pedro del Pinatar (TT.MM. Pilar de la Horadada y San Pedro del Pinatar. Provincias de Alicante y Murcia) ¹	5,250	-	-	-	-	-	
4.1.12- Encargo de Servicios a TRAGSATEC para la redacción de proyectos de defensa contra inundaciones, restauración ambiental y saneamiento	0,107	-	0,107	-	0,076	-	
4.1.14- Ayudas inundación. RD 1158/2020	0,200	-	0,200	-	0,200	-	
4.1.14.2- Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar	0,200	-	0,200	-	0,200	-	
4.2.- Renovación de la impulsión de la rambla del Albuñón	0,385	2,58%	0,385	2,58%	0,374	2,51%	14,90
4.2.1- Obra de Reparación Urgente de la impulsión de El Albuñón a El Mojón ¹	0,385	-	0,385	-	0,374	-	
4.3.- Actuaciones complementarias: saneamiento y depuración en la cuenca vertiente al Mar Menor	3,500	5,44%	3,500	5,44%	3,500	5,44%	64,30
4.3.6- RD 730/2022 Ayudas de carácter municipal para la implantación de medidas de saneamiento	3,500	-	3,500	-	3,500	-	
4.3.6.4- Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar	3,500	-	3,500	-	3,500	-	
TOTAL	13,611	2,81%	4,192	0,87%	4,150	0,86%	484,42
TOTAL (Solo proyectos o actuaciones que, en su totalidad, se ubican en el TM de San Pedro del Pinatar)	7,976	1,65%	3,807	0,79%	3,776	0,78%	

¹ Actuación ubicada en varios términos municipales, entre ellos San Pedro del Pinatar.

Torre Pacheco (1/2)

Fecha de actualización de datos: marzo de 2023

LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS	I. INICIADO		II. COMPROMETIDO/ CONTRATADO		III. EJECUTADO		MAPMM
	Mill. €	%	Mill. €	%	Mill. €	%	
2.- Restauración y mejora ambiental en el ámbito de la cuenca del Mar Menor. Soluciones basadas en la naturaleza	0,175	0,08%	-	-	-	-	227,90
2.2.- Renaturalización y mejora ambiental de las Ramblas y creación de corredores verdes que doten de conectividad a toda la red de drenaje, en especial en las ramblas afectadas por la minería	0,175	0,15%	-	-	-	-	115,90
2.2.5- Servicios para la redacción de los anteproyectos de actuaciones de protección de inundaciones en el entorno de Los Alcázares, Torre Pacheco y la desembocadura de la Rambla del Albuñón .TT.MM. de Cartagena, Torre Pacheco y Los Alcázares (Murcia) ¹	0,175	-	-	-	-	-	
2.2.5.1- Protección Frente a Inundaciones y la Restauración Ambiental de la Rambla del Albuñón TT.MM. Varios (Murcia) ²	0,175	-	-	-	-	-	
4. Gestión de riesgos de inundaciones y actuaciones de reducción de la carga contaminante	38,034	20,90%	2,606	1,43%	2,404	1,32%	182,00
4.1.- Actuaciones de gestión de riesgos de inundaciones	30,954	30,11%	0,814	0,79%	0,694	0,67%	102,80
4.1.1- Servicios para la redacción de los anteproyectos de actuaciones de protección de inundaciones en el entorno de Los Alcázares, Torre Pacheco y la desembocadura de la Rambla del Albuñón .TT.MM. de Cartagena, Torre Pacheco y Los Alcázares (Murcia) ¹	0,140	-	-	-	-	-	
4.1.1.2- Sistema de Drenaje Urbano Sostenible SUDS y Corredor Verde para la protección del norte del casco urbano de Los Alcázares (TT.MM de Torre Pacheco, San Javier y Los Alcázares. Prov. Murcia) ²	0,140	-	-	-	-	-	
4.1.5- Obras del Proyecto de Corredor Verde al oeste del casco urbano de Torre Pacheco y Adecuación Hidrológica de la Rambla de La Señora (T.M. Torre Pacheco - Murcia)	30,000	-	-	-	-	-	
4.1.12- Encargo de Servicios a TRAGSATEC para la redacción de proyectos de defensa contra inundaciones, restauración ambiental y saneamiento ²	0,215	-	0,215	-	0,152	-	
4.1.13- Contrato de Servicios para el proyecto de dos Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) y un sistema de Drenaje Sostenible (SUDS), de escorrentía en la Cuenca de la Rambla de La Maraña cerca de Roldán y Bal-cas, TT. MM. de Murcia y Torre Pacheco (Murcia) ²	0,099	-	0,099	-	0,042	-	
4.1.14- Ayudas inundación. RD 1158/2020	0,500	-	0,500	-	0,500	-	
4.1.14.5- Ayuntamiento de Torre Pacheco	0,500	-	0,500	-	0,500	-	

Torre Pacheco (2/2)

Fecha de actualización de datos: marzo de 2023

LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS	I. INICIADO		II. COMPROMETIDO/ CONTRATADO		III. EJECUTADO		MAPMM
	Mill. €	%	Mill. €	%	Mill. €	%	
4.3.- Actuaciones complementarias: saneamiento y depuración en la cuenca vertiente al Mar Menor	7,080	11,01%	1,792	2,79%	1,711	2,66%	64,30
4.3.1- Contrato de servicios para la redacción de Proyecto Colector Aguas Depuradas de las EDAR de Torre Pacheco y Los Alcázares hasta la EDAR de San Javier, y otros ²	0,292	-	0,292	-	0,211	-	
4.3.2- Obra del Colector de aguas depuradas de las EDAR de Torre Pacheco y Los Alcázares hasta la EDAR de San Javier ²	5,288	-	-	-	-	-	
4.3.6- RD 730/2022 Ayudas de carácter municipal para la implantación de medidas de saneamiento	1,500	-	1,500	-	1,500	-	
4.3.6.7- Ayuntamiento de Torre Pacheco	1,500	-	1,500	-	1,500	-	
6. Apoyo a la transición de sectores productivos	2,760	-	2,760	-	-	-	
6.3.- Otras ayudas de carácter transversal	2,760	-	2,760	-	-	-	
6.3.5- La memoria del Agua (Torre Pacheco)	2,760	-	2,760	-	-	-	
TOTAL	40,968	8,46%	5,366	1,11%	2,404	0,50%	484,42
TOTAL (Solo proyectos o actuaciones que, en su totalidad, se ubican en el TM de Torre Pacheco)	34,760	7,18%	4,760	0,98%	2,000	0,41%	

¹ La redacción de estos anteproyectos forma parte de un contrato de servicios que se encuentra en licitación (se ha hecho una distribución proporcional entre ellos, en función de la medida a la que corresponde).

² Actuación ubicada en varios términos municipales, entre ellos Torre Pacheco.

Detalle de la ejecución presupuestaria por Municipios

La Unión

Fecha de actualización de datos: marzo de 2023

LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS	I. INICIADO		II. COMPROMETIDO/ CONTRATADO		III. EJECUTADO		MAPMM
	Mill. €	%	Mill. €	%	Mill. €	%	
2.- Restauración y mejora ambiental en el ámbito de la cuenca del Mar Menor. Soluciones basadas en la naturaleza	46,260	20,30%	-	-	-	-	227,90
2.3.- Actuaciones de restauración de emplazamientos mineros peligrosos abandonados y restauración de zonas afectadas por la minería en la zona de influencia del Mar Menor	46,260	115,65%	-	-	-	-	40,00
2.3.1- Remediación ambiental de residuos mineros y emplazamientos afectados por la minería en los TTMM de Cartagena y La Unión	46,260	-	-	-	-	-	
2.3.1.2 y 2.3.1.11- C2: Colegio Público e Instituto La Unión	1,870	-	-	-	-	-	
2.3.1.3 y 2.3.1.12- C3: Benzales	2,860	-	-	-	-	-	
2.3.1.4 y 2.3.1.13- C4: Brunifa	20,080	-	-	-	-	-	
2.3.1.5 y 2.3.1.13- C5: Descargador ¹	8,950	-	-	-	-	-	
2.3.1.6 y 2.3.1.15- C6: Cuesta de Las Lajas	2,240	-	-	-	-	-	
2.3.1.9- C9: Torrecica	10,260	-	-	-	-	-	
4. Gestión de riesgos de inundaciones y actuaciones de reducción de la carga contaminante	1,000	0,55%	1,000	0,55%	1,000	0,55%	182,00
4.3.- Actuaciones complementarias: saneamiento y depuración en la cuenca vertiente al Mar Menor	1,000	1,56%	1,000	1,56%	1,000	1,56%	64,30
4.3.6- RD 730/2022 Ayudas de carácter municipal para la implantación de medidas de saneamiento	1,000	-	1,000	-	1,000	-	
4.3.6.8- Ayuntamiento de La Unión	1,000	-	1,000	-	1,000	-	
5. Conservación de la Biodiversidad	2,000	40,82%	2,000	40,82%	0,150	3,06%	4,90
5.3.- Creación de un centro de producción de especies marinas para proyectos de restauración	2,000	50,00%	2,000	50,00%	0,150	3,75%	4,00
5.3.2- Mejora de las instalaciones para la multiplicación de especies marinas (La Unión, Murcia)	2,000	-	2,000	-	0,150	-	
TOTAL	49,260	10,17%	3,000	0,62%	1,150	0,24%	484,42
TOTAL (Solo proyectos o actuaciones que, en su totalidad, se ubican en el TM de La Unión)	40,310	8,32%	3,000	0,62%	1,150	0,24%	

¹ Actuación ubicada en varios términos municipales, entre ellos La Unión.

Otros Águilas y Pilar de la Horadada

Fecha de actualización de datos: marzo de 2023

LÍNEAS MAPMM- MEDIDAS- ACTUACIONES Y PROYECTOS	I. INICIADO		II. COMPROMETIDO/ CONTRATADO		III. EJECUTADO		MAPMM
	Mill. €	%	Mill. €	%	Mill. €	%	
4. Gestión de riesgos de inundaciones y actuaciones de reducción de la carga contaminante	5,357	2,94%	0,107	0,06%	0,076	0,04%	182,00
4.1.- Actuaciones de gestión de riesgos de inundaciones	5,357	5,21%	0,107	0,10%	0,076	0,07%	102,80
4.1.10- Obras del Proyecto de Zonas de Almacenamiento Controlado (ZAC) en ramblas vertientes a San Pedro del Pinatar (TT.MM. Pilar de la Horadada y San Pedro del Pinatar. Provincias de Alicante y Murcia) ¹	5,250	-	-	-	-	-	
4.1.12- Encargo de Servicios a TRAGSATEC para la redacción de proyectos de defensa contra inundaciones, restauración ambiental y saneamiento ¹	0,107	-	0,107	-	0,076	-	
5. Conservación de la Biodiversidad	13,000	265,31%	13,000	265,31%	-	-	4,90
5.3.- Creación de un centro de producción de especies marinas para proyectos de restauración	13,000	325,00%	13,000	325,00%	-	-	4,00
5.3.1- Construcción del centro estatal para la conservación y reproducción de especies marinas para la conservación de la biodiversidad marina (TM Águilas)	13,000	-	13,000	-	-	-	
TOTAL	18,357	3,79%	13,107	2,71%	0,076	0,02%	484,42

¹ Actuación ubicada en varios términos municipales, entre ellos Pilar de la Horadada.
